


11.04

Veður (tekið af YR.NO 02.12.2025)

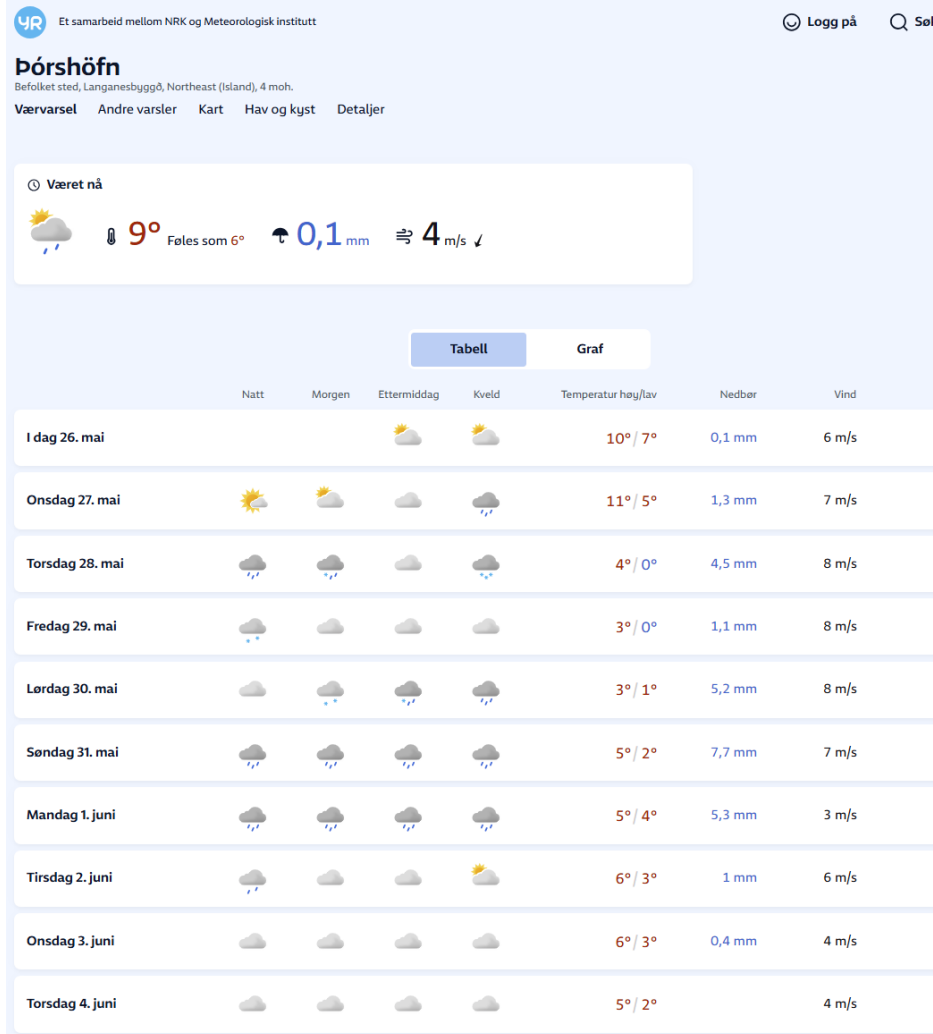

11.05

Mannafli og tæki

Verktaki	Mannskapur	Tæki / Búnaður
B.J. Vinnuvélar	0	0
Garðvík	3-4	3
Samtala	3-4	3

11.06

Efnisútvegum og magn.

- Leiktæki sem vantaði eru komin. Það eftir að greina hvort að allat sé komið á staðinn (þF)
- GV athugar stöðuna á öðru efni hjá þF (drenbarkar og jarðvegsdúkur)
- Timbur í brú, dregarar 45*95mm Gagnvarið skv. Teikningu
- Efnisútvegum vegna aukaverk / viðbótarverk 9.A – Er á hendi Verkkaupa
 - Drenmöl
 - Drenbarkar
 - Jarðvegsdúkur
 - Annað
- Ídráttarrör fyrir rör í taltæki Er ekki komið niður, verður gert samhliða uppsetningu á leiktækjum.
- Það getur verið að það vanti íhluti við leiktæki þF afhendir tæki á verkstað
GV fer yfir hvort að allt sé með sem á að vera

11.07 Öryggismál.

1. Reglum vinnueftirlits skal framfylgt, það er á ábyrgð hvers og eins / verktaka að framfylgja því að plan um öryggis mál sé sýnilegt í vinnuskúr.
2. Minnt á mikilvægi þess að skila inn öryggisáætlun
Öryggisáætlun skal skila inn til Vinnueftirlits.
3. Öryggisgirðing notast verður við núverandi girðingu að undanskildri aðkomu (BJ setur hlið þar sem verður opnað)
4. Það þarf að taka til fyrir utan svæðið (Langanesbyggð)
5. Merkja svæðið Vinnusvæði „óviðkomandi aðgangur bannaður“

11.08 Aðkoma að vestan

- a. Setja hlið við inngang inn á svæði (Langanesbyggð setur BYKO grind)
- b. Það þarf að vera samráð við Leikskóla v. Matarsendingar sem verða um inngang að vestan



11.09 Barnaból

1. Bannað að reykja á lóðinni
2. Geta verið inni bara að tala við umsjónarmenn / kennara
3. Útivera barna
-10:20-11:30
-Sofandi börn 12:10-14:30
4. Gott að fá plan frá Garðvík með einhverra daga fyrirvara um grófvinnu.

11.10 Breytingar gagna.

1. Engar breytingar

11.11 Kröfur verktaka.

1. XX

11.12 Eldri óafgreidd mál.

2. XX

11.13 Samskipti.

1. Margir óþarfa tölvupóstar sendir á alla í grúppunni. Bið um að safna saman og senda helst einn póst á hverjum degi. Það sparar tíma hjá okkur hinum.

11.14 Mælingar / prófanir.

1. Stærð hvors hellulagðs svæðis fyrir sig.
2. Lengd kantsteins á hvoru svæði fyrir sig.

11.15 Úttektir

1. HF sendir 4-6 myndir af svæðinu 1 - 2 á viku
2. Úttekt eftirlitsaðila verkkaupa ef við á

11.16 Greiðsla, Uppgjör.

1. Framvinda 4 (Garðvík) samþykkt

11.17 Aukaverk

1. Liður 8.5.2 Jöfnunarlag undir hellur Magn fer úr 19m³ í Magnaukning 19m³ færð í 9. Kafla
2. Hellur og jöfnunarlag í sandkassa komi í kafla 9.
3. Slitlag á stíga 175m² á kr. 875.000
Liðurinn skal vera skv. Lýsingu að neðan og innihalda allt til að fullgera verkið.
malarbornir og er þetta gert úr 0-8 sandi / 0-19 efni sem er harðþjappað og svo stráð yfir með steinefni 6-8 mm min. 30mm
4. Fjarlægja runnabeð norðaustur
5. Fjarlægja staur, grafa upp illgresi og moka í holu
6. Aðlögun þökulagnar að girðingu

11.18 Viðbótarverk.

1. Aukaverk 9.A

- Metið að halda núvefrandi hönnun + viðbótar hönnun með jarðvegslögnum.
- Það þarf að skafa ofan af klöppum
- Taka myndir þegar búið að er leggja lagnir
- Bæta við Ø400 hreinsibrunnum sbr. riss að neðan (bláir hringir)



2. Aukaverk 9.A
Kostnaðaráætlun kr. 7.190.000 (efni og vinna) kr. 4.545.000 (án efnis sbr. Tilboðs Garðvík. 120% af kostnaðaráætlun.
Verð frá Garðvík kr. 5.460.000
(undanskilið efni, drennbarka og tengistykki, drendúk og drenmalarefni sem útvegast af verkkaupa. Einnig undanskilið "taka upp hellur" 9.A.1.1)
Kostnaður skýrist að mestum hluta af vinnu við hellulagningu í sandkassa (liður ekki inn í kostnaðaráætlun)

11.19

Önnur mál.

1. Ljósleiðari innan lóðar GV er meðvitaður
2. Lýsing
 - Notaður núverandi lýsing (GV og ÞF)
 - Það er hægt að plægja rafmagnsstrengi niður fyrir framtíðar lýsingu
 - Eftirlitshandbók / Gátlisti kemur frá hönnuði Arnar.
Handbók um öryggi barna á leikskóla.
Gæta að hafa eftirlitbók einfalda

Fundi lokið kl. 15:00

Næsti fundur.

Ekki ákveðið / eftir þörfum.

Dreifing.



Almar Eggertsson
Owner



arnar@tsnl.is
Guest



BS Björn Sigurður Lárusson
Guest



B bjvinnuvelar@simnet.is
Guest



F fridrik@velavorur.is
Guest



G gudmundur@velavorur.is
Guest



HJ Halldóra Jóhanna Friðbergadóttir
Guest



Hermann Herbertsson
Member



Knútur Emil Jónasson
Member



S steinivill666@gmail.com
Guest



T thorri.fridriksson@langanesbyggd.is
Guest
