



Verknúmer 12019	Verkkaupi Langanesbyggð
Dagsetning / tími 16/12.2025 / 11:00	Verkpáttur Barnaból. Leiksvæði - Jarðvinna og frágangur lóðar
Unnið af Almar E.	Staðsetning / Lýsing Miðholt 6 680 Þórshöfn
Verkkaupi / Tengiliður Björn S. Lárusson	Dreifing: Barnaból-Vinnuhópur - Jarðvinna - Frág. lóðar og upps. leikt.

Boðaðir til verkfundar:

Almar Eggertsson	(AE)	Faglausn
Hermann Herbertsson	(HH)	Faglausn
Arnar Ólafsson	(AO)	Teiknistofa norðurlands (TSNL)
Björn S. Lárusson	(BS)	Langanesbyggð (Sveitastjóri)
Þorri Friðriksson	(ÞF)	Langanesbyggð (Áhaldahús)
Halldóra J. Friðbergdóttir	(HF)	Langanesbyggð (Barnaból)
Þórir Jónsson	(ÞJ)	B.J. Vinnuvélar
Þorsteinn V. Þórisson	(ÞÞ)	B.J. Vinnuvélar
Guðmundur Vilhjálmsson	(GV)	Garðvík
Friðrik Guðmundsson	(FG)	Garðvík

Fráverandi: Þórir Jónsson, Þorsteinn V. Þórisson, Friðrik Guðmundsson**Afboðaðir:** Hermann Herbertsson, Björn S. Lárusson, Þorri Friðriksson
Fylgiskjal:**09.01 Fundargerð.**

Fundargerðin skilst sem skriflegt samkomulag milli þeirra sem viðkemur málið. Hafi ekki komið athugasemd seinast, fyrir næsta fund á eftir er fundargerð þessi samþykkt með undirskrift eftirlits og verktaka.

09.02 Athugasemdir vegna síðustu fundargerðar.

Síðasta fundargerð er samþykkt.

09.03 Verkáætlun

1. Verkáætlun yfirfarin 16.12.2025
Um 65% lokið

ACTIVITY	PLAN START	PLAN DURATION	ACTUAL START	ACTUAL DURATION	PERCENT COMPLETE	PERIODS
						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
B.J. Vinnuvélar						
Aðstöðusköpun	39	1	39	1	100%	
Rif á Búnaði	39	2	39	2	100%	
Jarðvinna gróftur	39	2	39	2	100%	
Jarðvinna fylling	40	2	40	2	100%	
Jarðvinna Yfirborðsefni	41	2	41	2	100%	
Garðvík						
Aðstöðusköpun	41	1	41	0	100%	
Grjót og grjótleiðslur	42	2	41	0	85%	
Uppr. á grjóti fyrir sandkassa	43	2	41	0	85%	
Tímurburði	41	5	0	0	5%	
Kantsteinar	42	2	42	0	65%	
Hellulagnir (jöfnunarlag undir)	42	3	42	0	50%	
Rekav. Frág. Við sandkassa	45	1	0	0	0%	
Þökulagnir	45	30	42	0	95%	
Uppsetning leiktækja	44	3	43	0	45%	
Activity 15	0	0	0	0	0%	

09.04

Veður (tekið af YR.NO 02.12.2025)

Bórshöfn

Befolketið, Langanesbyggð, Northeast (Island), 4 moh.

Værværsel Andre varslar Kart Hav og kyst Detaljer

Været nú

 **1°** Føles som -6°  **0 mm**  **9 m/s** →

Tabell

Graf

	Natt	Morgen	Ettermiddag	Kveld	Temperatur høg/lav	Nedber	Vind
I dag 16. des.					1° / -5°	0,1 mm	9 m/s
Onsdag 17. des.					1° / -7°	7,1 mm	14 m/s
Torsdag 18. des.					1° / -3°		2 m/s
Fredag 19. des.					1° / 0°	0,4 mm	2 m/s
Lördag 20. des.					2° / 0°	2 mm	5 m/s
Söndag 21. des.					2° / -4°	0,1 mm	6 m/s
Mandag 22. des.					-1° / -4°		2 m/s
Tísdag 23. des.					-1° / -7°		2 m/s
Onsdag 24. des.					2° / -2°		3 m/s

Oppdatert kl. 05:16.

09.05

Mannafli og tæki

Verktaki	Mannskapur	Tæki / Búnaður
B.J. Vinnuvélar	0	0
Garðvík	0	3
Samtala	0	0

09.06

Efnisútvegur og magn.

1. Drenmöl er til á staðnum þF semur við Þórð Þórðar
2. GV athugar stöðuna á öðru efni hjá þF (drenbarkar og jarðvegsdúkur)
3. Timbur í brú, dregarar 45*95mm Gagnvarið skv. Teikningu
4. Efnisútvegur vegna aukaverk / viðbótarverk 9.A – Er á hendi Verkkaupa
 - a. Drenmöl
 - b. Drenbarkar
 - c. Jarðvegsdúkur
 - d. Annað
5. Leiktæki sem ekki eru á staðnum
Búið að staðfesta pöntun áætluð afhending vika 46 (Ekki vitað þorri ekki á staðnum)
6. Ídráttarrör fyrir rör í taltæki Er ekki komið niður, verður gert samhliða uppsetningu á leiktækjum.
Það er hægt að draga rör í gegnum 110mm (áður komið svar (sjá V-7))
7. Það getur verið að það vanti íhluti við leiktæki
þF afhendir tæki á verkstað
GV fer yfir hvort að allt sé með sem á að vera

09.07 Öryggismál.

1. Reglum vinnueftirlits skal framfylgt, það er á ábyrgð hvers og eins / verktaka að framfylgja því að plan um öryggis mál sé sýnilegt í vinnuskúr.
2. Minnt á mikilvægi þess að skila inn öryggisáætlun
Öryggisáætlun skal skila inn til Vinnueftirlits.
3. Öryggisgirðing notast verður við núverandi girðingu að undanskildri aðkomu (BJ setur hlið þar sem verður opnað)
4. Það þarf að taka til fyrir utan svæðið (Langanesbyggð)
5. Merkja svæðið Vinnusvæði „óviðkomandi aðgangur bannaður“

09.08 Aðkoma að vestan

- a. Setja hlið við inngang inn á svæði (Langanesbyggð setur BYKO grind)
- b. Það þarf að vera samráð við Leikskóla v. Matarsendingar sem verða um inngang að vestan



09.09 Barnaból

1. Geta verið inni bara að tala við umsjónarmenn / kennara
2. Útivera barna
-10:20-11:30
-Sofandi börn 12:10-14:30
3. Gott að fá plan frá Garðvík með einhverra daga fyrirvara um grófvinnu.

09.10 Breytingar gagna.

1. Engar breytingar

09.11 Kröfur verktaka.

1. XX
2. XX

09.12 Eldri óafgreidd mál.

1. XX
2. XX

09.13 Samskipti.

1. Margir óþarfa tölvupóstar sendir á alla í grúppunni. Bið um að safna saman og senda helst einn póst á hverjum degi. Það sparar tíma hjá okkur hinum.

09.14 Mælingar / prófanir.

1. Stærð hvors hellulagðs svæðis fyrir sig.
2. Lengd kantsteins á hvoru svæði fyrir sig.

09.15 Úttektir

1. HF sendir 4-6 myndir af svæðinu 1 - 2 á viku
2. Úttekt eftirlitsaðila verkkaupa ef við á

09.16 Greiðsla, Uppgjör.


1. Framvinda 4 (Garðvík) samþykkt

09.17 Aukaverk

1. Liður 8.5.2 Jöfnunarlag undir hellur Magn fer úr 19m³ í Magnaukning 19m³ færð í 9. Kafla
2. Hellur og jöfnunarlag í sandkassa komi í kafla 9.
3. Slitlag á stíga 175m² á kr. 875.000
Liðurinn skal vera skv. Lýsingu að neðan og innihalda allt til að fullgera verkið.
malarbornir og er þetta gert úr 0-8 sandi / 0-19 efni sem er harðþjappað og svo stráð yfir með steinefni 6-8 mm min. 30mm
4. Fjarlægja runnabeð norðaustur
5. Fjarlægja staur, grafa upp illgresi og moka í holu
6. Aðlögun þökulagnar að girðingu

09.18 Viðbótarverk.

1. **Aukaverk 9.A**
Kostnaðaráætlun kr. 7.190.000 (efni og vinna) kr. 4.545.000 (án efnis sbr. Tilboðs Garðvík. 120% af kostnaðaráætlun.
Verð frá Garðvík kr. 5.460.000
(undanskilið efni, drenbarka og tengistykki, drendúk og drenmalarefni sem útvegast af verkkaupa. Einnig undanskilið "taka upp hellur" 9.A.1.1)
Kostnaður skýrist að mestum hluta af vinnu við hellulagningu í sandkassa (liður ekki inn í kostnaðaráætlun)
2. Upptaka á hellum úr botni sandkassa og uppsköfun sands er lokið með vísan í samþykkt aukaverk.
3. Muna eftir ný lögðum ljósa streng (röri) sem er í botni sandkassa.
4. Ákveðið að byrja EKKI á jarðvatnslögnum þar sem jörð er frosin og ekki fyrirsjáanlegt veður til að hefja slíka vinnu
5. Magntaka í tilboðsskrá þarfnast yfirferðar, það vantar magn við drenbarka, jarðvegsdúk og drenmöl.
6. Einingarverð í tilboðsskrá mörg mjög há
7. AE sendir yfirfarna magnskrá til GV. GV yfirfer tilboð
8. ÞF leggur til að jarðvatnslögn verði tengd inn á lögn við Fjarðarveg 5
9. Mögulega þarf að skoða og meta fráveitu við Fjarðarveg 5, hvort að lögn geti tekið við jarðvatni frá leiksólalóðl

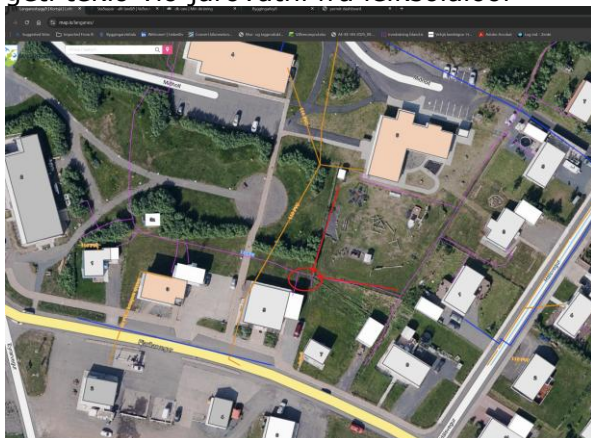

09.19 Önnur mál.

1. Lagnir í lóð. Athuga sérstaklega hvort að einhverjar lagnir séu í lóð þar sem grafið verður fyrir jarðvatnslögnum (Rafmagn/Smáspenna) Rarik, Míla og Tengir. ÞF skoðar lagnamál í lóð.

Fundi lokið kl. 11:30

Næsti fundur.

13.01.2026 / 11:00

Dreifing.



Almar Eggertsson
Owner



arnar@tsnl.is
Guest



Björn Sigurður Lárusson
Guest



bjvinnuvelar@simnet.is
Guest



fridrik@velavorur.is
Guest



gudmundur@velavorur.is
Guest



Halldóra Jóhanna Friðbergsdóttir
Guest



Hermann Herbertsson
Member



Knútur Emil Jónasson
Member



steinivill666@gmail.com
Guest



thorri.fridriksson@langanesbyggd.is
Guest
