

# Verkfundur 01

<b>Verknúmer</b> 12026	<b>Verkkaupi</b> Langanesbyggð
<b>Dagsetning / tími</b> 10.04.2026 / 09:00	<b>Verkpáttur</b> Endurgerð A og B rif – Rif og undirbúningur C
<b>Unnið af</b> Almar E.	<b>Staðsetning / Lýsing</b> Langanesvegur 20
<b>Verkkaupi / Tengiliður</b> Björn S. Lárusson	680 Þórshöfn <b>Dreifing:</b> Vinnuhópur

**Boðaðir til rýnifundar:** (mættir eru bláir)

Almar Eggertsson	(AE)	Faglaun
Arnar Ólafsson	(AO)	Teiknistofa norðurlands (TSNL)
Björn L. Sigurðsson	(BS)	Langanesbyggð (Sveitastjóri)
Þorri Friðriksson	(ÞF)	Langanesbyggð (Áhaldahús)
Sigurður Þór Guðmundsson	(SG)	Langanesbyggð (Oddvitii)
Hilma Steinarsdóttir	(HS)	Langanesbyggð (Skólustjóri)
Steinunn Guðnadóttir	(SG)	Langanesbyggð (Grunnskóli)
Júlíus Sigurbjartsson	(JS)	Langanesbyggð (Sveitastjórn)
Sigríður Friðný Halldórsdóttir	(SH)	Langanesbyggð (Sveitastjórn)
Arnór Ísak Haddsson	(AH)	Faglaun

**Fráverandi:**

XX

**Afboðaðir:**

XX

**Fylgiskjal:**

**01.01 Fundargerð.**

Fundargerðin skilst sem skriflegt samkomulag milli þeirra sem viðkemur málið. Hafi ekki komið athugasemd seinast, fyrir næsta fund á eftir er fundargerð þessi samþykkt.

**Rautt letur er nýtt (fyrsta fundargerð allt svart)**


Svart letur er frá eldri fundargerðum

**01.02 Athugasemdir vegna síðustu fundargerðar.**

Þetta er fyrsti verkfundur

**01.03 Verkáætlun**

Skólaasetning 20/08/2026

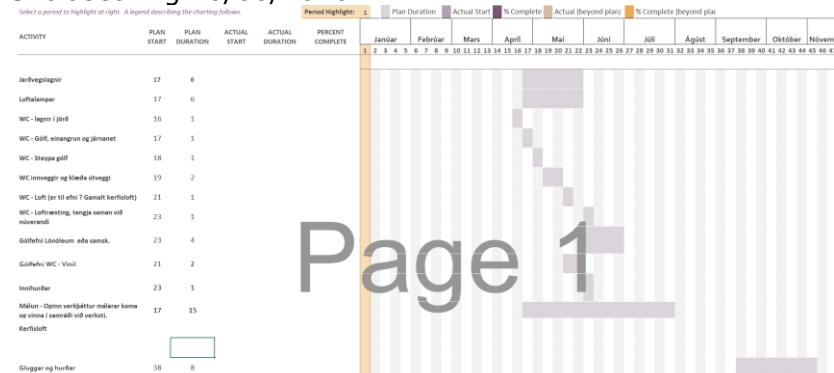

Page 1

## Verkfundur 01

1. RAF – Færa smáspennuskáp af lofti. Best að koma hönum fyrir í anddyri
2. Taka niður loftræsilagnir C Helmingur komin niður  
Geyma loftræsilagnir, mögulega hægt að nota við nýbyggingu.
3. Sökkklar og jarðvegslagnir norður
4. Securitas þarf að koma og breyta öryggiskerfi MHL 03 og 04 (Rás 1)  
Víkurráð verða í sambandi við SC
5. Aftengja rafmagn / lokar o.fl. við loftræsilagnir í C
6. Ljósleiðari – Farin beiðni á Tengir  
Færa ljósleiðara í hol við hliðina á skrifstofu (gamli skólastj)
7. Skipta um alla lampa í A, B og anddyri. Setja Led í staðinn sem passa í
8. Snyrtingar B
  - a. leggja nýja fráveitu
  - b. Nýtt neysluvatn
  - c. Einangra og steypa nýtt gólf
  - d. Skoða hvort það þarf skilrúm á gangi til að ekki verði beint aðgengi inn á gang.
9. Lægra þak yfir B
10. Jarðvegslagnir - AE taki saman helstu magntölur og fái verð frá BJ

### 01.04 Efnisútvægungun

1. Gera skal ráð fyrir viku afgreiðslufresti með allt efni
2. Vikar sendir AE efnislista og magn AE sér um pöntun
3. ALLT efni skal yfirfarið og borið saman við efnispöntun þegar það kemur á verkstað. Staðfesta skal við AE að allt efni sé komið.
4. Síðasta efnispöntun gerð 8/4

#### Efnispöntun 01

v/ Grunnskóli A og B

Dags: \_\_\_\_\_

Fyrir: \_\_\_\_\_

Efni:	Stærð / Gerð	magn	ein.
Gólfleiðarar/stálprófilar	70mm	35	m
Veggstoðir/prófilar	70mm / L=2,5m	60	stk
Farmacell	12,5x1200x2700	25	stk
Farmacell lím		1	kassi
Skrúfa Farmacell/stálprófill		1000	stk
Múrblanda gróf		10	pokar
Múrblanda fín		20	pokar
Rakasperruplast 0,2	4X25	1	stk
Rakasperrulímband	50mm	3	stk
Hleðslusteinn	100-120mm	15	stk
Gegnumstreymisniðurfall	VNR. 26245101	4	stk

5. Það sem þarf að ákveða og næsta pöntun

Efni:	Stærð / Gerð	magn	ein.
Loftaefni?			
Gluggar	Staðlað á wc ?		
Hurðar wc	Hvernig		
WC innb. Hefðb. RIMFREE		3	stk
WC Fatl. RIMFREE		1	stk
Stoðir við wc fatl		2	stk
Handlaug veggh hefðb.		3	stk
Handlaug fatl.		1	stk
Spegill fyrir ofan vask		4	stk
wc rúlluhaldari		4	stk
Sápuskammtarar	Þorri	4	stk
Handþurrkubláasarar	Þorri	4	stk
Gólfefni wc	?		
Veggefni WC	?		



## Verkfundur 01

6. Ákveða Gólfefni AE á fund með Kjaran 13/4
7. Gluggar og hurðir – Afgreiðslutími 4+ mánuðir.

### 01.05 Mannafli og tæki (á verkstað)

1. Gera verksamninga / yfirlýsingu við verktaka, festa tímagjald, og ferðakostnað ?
2. Lagnir Vikar hefur verið í samtali við Norðurlagnir / Bílar og Vélar

Verktaki	Mannskapur	Tæki / Búnaður
Víkurráð	2	
Pípari	0	
Dawid smiður	1-2	
BJ Vinnuvélar	0	
<b>Samtala</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

### 01.06 Öryggismál.

1. Reglum vinnueftirlits skal framfylgt, það er á ábyrgð hvers og eins / verktaka að framfylgja því að plan um öryggis mál sé sýnilegt í vinnuskúr.
2. Minnt á mikilvægi þess að skila inn öryggisáætlun  
Öryggisáætlun skal skila inn til Vinnueftirlits. (á við um verktaka við niðurrif C)
3. Á við um niðurrif C - Öryggisgirðing skal reist utan um vinnusvæði þegar rif hefjast)
4. Aðkoma að skóla verður að vestan um núverandi aðalinngang

### 01.07 Verktakar.

1. Gera verksamninga / yfirlýsingu við verktaka, festa tímagjald, og ferðakostnað ?
2. Aftengja rafmagn / lokar o.fl. við loftræsilagnir í C

### 01.08 Úttektir

1. Úttekt eftirlitsaðila verkkaupa ef við á
2. XX

### 01.09 Greiðsla, Uppgjör.

1. Reikningar sendir út eftir sem verkinu miðar áfram skv. verksamningi

### 01.10 Viðbótarverk.

1. XX
2. XX

### 01.11 Önnur mál.

1. XX













# Verkfundur 01

**Fundi lokið kl. 10:30**

## **Næsti fundur.**

17/4/2026 / 10:30 (á staðnum)

## **Dreifing.**

	Almar Eggertsson Owner
	arnar@tsnl.is Guest
	Arnór Ísak Haddsson Member
	Björn Sigurður Lárusson Guest
	hilma.steinarsdottir@thorshafnarskoli.is Guest
	juliusisigurbjartsson@simnet.is Guest
	Knútur Emil Jónasson Member
	raudanes1@gmail.com Guest
	siggafridny@gmail.com Guest
	sigurdur.thor.gudmundsson@langanesbyggd.is Guest
	steinunn@thorshafnarskoli.is Guest
	thorri.fridriksson@langanesbyggd.is Guest
