

Verkfundur 06

Verknúmer 12026	Verkkaupi Langanesbyggð
Dagsetning / tími 23.06.2026 / 11:00	Verkpáttur Endurgerð A og B rif – Rif og undirbúningur C
Unnið af Almar E.	Staðsetning / Lýsing Langanesvegur 20
Verkkaupi / Tengiliður Bjarnheiður Jónsdóttir	680 Þórshöfn Dreifing: Vinnuhópur

Boðaðir til rýnifundar:	(mættir eru bláir)
Almar Eggertsson	(AE) Faglausn
Víkar Vífilsson	(VF) Rauðanes ehf
Þorsteinn Vilberg	(ÞV) BJ. Vinnuvélar
Bjarnheiður Jónsdóttir	(BJ) Langanesbyggð (Staðgengill sveitastjóra)
Jóhann Hafberg Jónasson	(JJ) Langanesbyggð (Oddviti)
Þorri Friðriksson	(ÞF) Langanesbyggð (Áhaldahús)
Hilma Steinarsdóttir	(HS) Langanesbyggð (Skólastjóri)
Steinunn Guðnadóttir	(SG) Langanesbyggð (Deildarstjóri)
Áki Hauksson	(ÁH) Víkurraf

*Til staðar á fundir, merktir **Bláir** hér að ofan.

Fráverandi: Þorsteinn Vilberg, Jóhann Hafberg Jónasson, Steinunn Guðnadóttir

Afboðaðir: Hilma Steinarsdóttir, Áki Hauksson

Fylgiskjal:

06.01 Fundargerð.

Fundargerðin skilst sem skriflegt samkomulag milli þeirra sem viðkemur málið. Hafi ekki komið athugasemd seinast, fyrir næsta fund á eftir er fundargerð þessi samþykkt.

*Rautt letur er ný bókun

*Blátt frá síðasta fundi

*Svart letur er frá eldri fundargerðum

06.02 Athugasemdir vegna síðustu fundargerðar.

Engar athugasemdir

06.03 Verkáætlun

Skólasetning 20/08/2026

1. Dúkari fimmtudaginn 9. Júlí 3-4 menn í 4 daga
2. Víkurraf. Vikar / Þorri verða í sambandi eftir þörfum
3. Gluggakarmar í skólastofur er í vinnslu, verður klárt til ísetningar undir lok júlí. (Vika 30)
4. Gler eru áætluð tilbúin 2.júlí hjá ISPAN, þá verður þeim pakkað og komið á stöð í Reykjavík

Helstu verkþættir B

1. Flísaleggja wc. Gólf búin, vantar á vegg.
Flísar áætlaðar til landsins 7/7 (vika 28) Flísalögn viku 29 eftir dúkara



Verkfundur 06

2. Setja upp innréttingar og hreinlætistæki WC, eftir flísalögn, Innréttingar ekki komnar
3. Setja upp slökkvitæki, tæki koma 23.6 (í dag)
4. Gera gat v. Gluggi í smíðastofu
5. Skipta út eitthvað af loftaplötum. Eftir rafvirkja og málara.
6. Setja vængjahurð í á milli stofa í B álmu, eftir dúkara.
7. Þak í B álmu - Lokafrágangur, áfellur.
8. Frágangur á glerjum í innveggi A og B álma, þegar þau koma. (Vika 30)
9. Laga frágang í kringum nýja glugga wc úti.
10. Smíða trétröppur inn í kyndikompu.
11. Laga nokkur opnanleg fög, skipta um stormjárn.
12. Festa lúgu utan á gólfhitakistu wc.
13. Fjölga ljósum í anddyri þar sem kennarar verða með skrifstofu. **VÍKURRAF ?**
14. Dúkaleggja A og B (Vika 28 / 9-12. júlí)
15. Eldhús, bráðabirgða í Anddyri. komið vatn og rafmagn, á eftir að setja saman innréttingu og taka gat út fyrir frárennsli.
16. Uppsetning á hillum, TV, tússtöflum og fl. Síðast.
17. Flutningur frá Brimholti yfir í skóla
18. Flutningur frá Þórsveri yfir í skóla.
19. Þrifa gardínur, spurning um að senda í hreinsun??
20. Lokaþrif á öllu. (Langanesbyggð)
21. Skipta um Innihurðar, í vetur, langur afgreiðslutími.
22. Ljósleiðari, tengja
23. Netskápur, vantar switch
24. Það komu menn frá Advania á Miðvikudaginn og löbbuðu hring, þeir koma örugglega með einhverja hugmynd um nýjan búnað.
25. Setja vængjahurð í á milli stofa í B álmu, eftir dúkara.

Helstu verkþættir C

1. Staðan er komin ákvörðun um framhaldið
Ekki komin ákvörðun um framhaldið
Sveitastjórn fundar í næstu viku (27)
2. Loka út úr C álmu í suður.
1. C Hluti – Nýr meirihluti - Ákveðið að rífa með fyrirvara um skoðun á fjárhagsáætlun. Ekkert gert fyrr en eftir skoðun á fjárhagsáætlun.
2. C- Rif Búið að rífa klæðningar að austan og sunnan farnar af. Verið að fjarlægja einangrun og pússningu að innan
3. C Hluti – Ákveðið að rífa með fyrirvara um skoðun á fjárhagsáætlun. Ekkert gert fyrr en eftir skoðun á fjárhagsáætlun.
4. Fjarlægja alla glugga og hurðar
5. Rífa þak, járn, borðaklæðningu og burðarvirki
6. Hreinsa einangrun og múr innan af útveggjum

Helstu verkþættir D

1. Hús er farið - Frágangur lóðar ?
Rífa staura upp og jafna
Bíða með frekari frágang

Verkfundur 06

06.04

Efnisútvægur (Gera skal ráð fyrir viku afgreiðslufresti með allt efni)

1. Nýjar hurðar í kennslustofur og önnur rými A og B
 - Tilboð bárust - BYKO 3.270 þús. og Parka 3.200 þús. Birgisson með 4.794 þús.
 - Tilboð frá BYKO metið hagstæðast þar sem hljóðeinangrun frá Parka uppfyllir ekki framsettar kröfur.
2. Baðinnréttingar x 3 Búið að panta afgr. Tími 4-6 vikur

06.05

Mannafli og tæki (á verkstað)

Verktaki	Mannskapur	Tæki / Búnaður
Vikar	1	
Gólfklúbburinn (Dúkari)	0	
Víkurrar (Reikna með næst vika 27)	0	
Pípari	0	
Dawid smiður	0	
BJ Vinnuvélar	0	0
Samtala	1	0

06.06

Öryggismál.

1. Reglum vinnueftirlits skal framfylgt, það er á ábyrgð hvers og eins / verktaka að framfylgja því að plan um öryggis mál sé sýnilegt í vinnuskúr.
2. Minnt á mikilvægi þess að skila inn öryggisáætlun
 - Öryggisáætlun skal skila inn til Vinnueftirlits. (á við um verktaka við niðurrif C)
3. Á við um niðurrif C - Öryggisgirðing skal reist utan um vinnusvæði þegar rif hefjast)
4. Aðkoma að skóla verður að vestan um núverandi aðalinngang

06.07


Verktakar.

1. Gera verksamninga / yfirlýsingu við verktaka, festa tímagjald, og ferðakostnað ?

06.08

Önnur mál.

1. Litamunur á loftaplötum

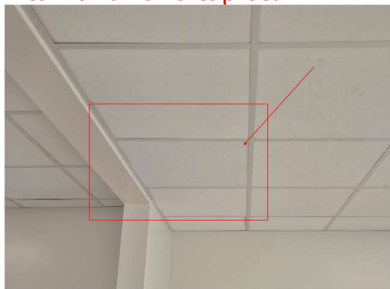

- Þetta er alveg viðbúið þegar verið að laga svona loft.
 - Tvennt hægt að gera.
 - a. Skipta plötum á milli rýma, taka eldri plötur annarstaðar frá t.d. tækni rými og setja nýju í það loft.
 - b. Kaupa nýjar plötu í eina stofu og eiga þannig gamlar til að gera við annarsstaðar.
1. Hurð út frá gangir B – hurð verður sett samhliða endurnýjun á gluggum og útveggjaklæðningu.
 2. Garðvík ath. Hreinsun á húsgögnum sem eru í geymslu þríf verða í samráði við Hilmu og Steinunni.

Verkfundur 06

Fundi lokið kl. 08:20

Næsti fundur.

07.07.2026 kl. 08:00 (AE mögulega á verkstað)

Dreifing.



Almar Eggertsson

Owner



raudanes1@gmail.com

Guest



hilma.steinarsdottir@thorshafnarskoli.is

Guest



arnar@tsnl.is

Guest



Arnór Ísak Haddsson

Member



Knútur Emil Jónasson

Member



juliussigurbjartsson@simnet.is

Guest



siggafridny@gmail.com

Guest



thorri.fridriksson@langanesbyggd.is

Guest



steinunn@thorshafnarskoli.is

Guest



johannj@langanesbyggd.is

Member



bjarnheidur.jonsdottir@langanesbyggd.is

Member

Áki Hauksson

(ÁH) Víkurraf
