

Leik011


Aðalskoðun leiksvæða

Leiðbeiningar	Aðalskoðun er framkvæmd samkvæmt reglugerð 1025/2022 um öryggi leikvallatækja og leiksvæða og eftirlit með þeim. Hafið samband á skrifstofu okkar ef spurningar vakna í síma 414-4444.
Úttektaraðili	BSI á Íslandi ehf
Heimilisfang	Skútuvogur 1d, 104 Reykjavík, Ísland.
Heimasíða	www.bsiaislandi.is
Netfang	info@bsiaislandi.is
Hlutleysi skoðunaraðila	Hagmunatengsl við aðila málsins af hálfu BSI á Íslandi eru engin.

Upplýsingar um svæði

Nafn svæðis	Grunnskólinn á Þórshöfn
Yfirlitsmynd af svæði	
Veðurskilyrði	Sól

Leik011

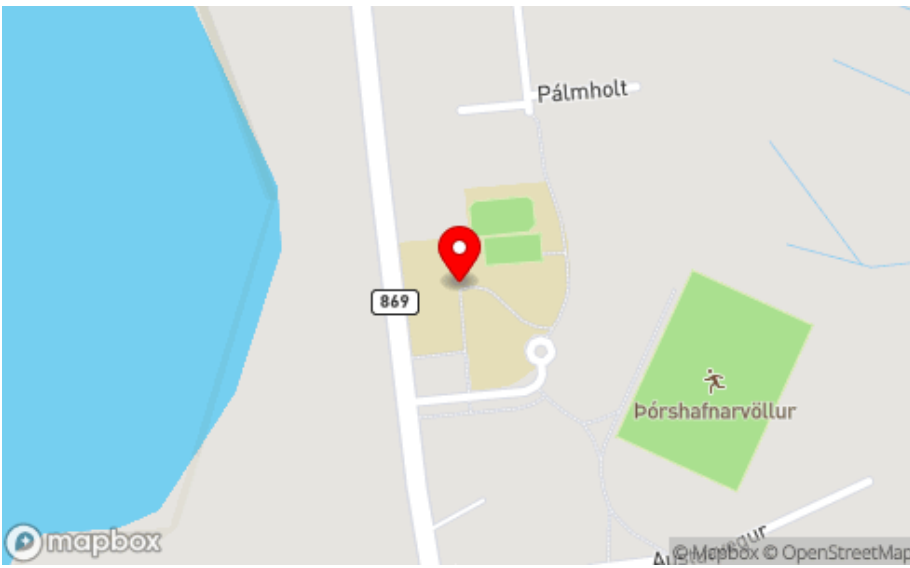Hnit / GPS	
	Lat: 66.2013774 Long: -15.3374086 - 20 Langanesvegur Þórshöfn, Langanesbyggð 680 Ísland
Tengiliður	Halldóra Friðbergsdóttir
Sími	4681220
Dagsetning skoðunar:	15.07.2025
Tegund skoðunar	Aðalskoðun
Næsta Skoðun	2026
Nr. Skoðunar:	ASVerknr-2025-4020
Rekstraraðili	Langanesbyggð
Tegund svæðis	Grunnskóli
Nafn skoðunaraðila:	Grétar Guðmundur Sæmundsson

Skýringar frávika og skammstafana

Leik011

Skýringartafla					
Nr.	Frávik	Tilvísun í staðal	Nr.	Frávik	Tilvísun í staðal
1	Annað (hvað?)		16	Festihætta	EN 1176-1: 4.2.7
2	Boltar	EN 1176-1: 4.2.5	17	Skemmdir	EN 1176-1: 3.2
3	Breytingar	EN 1176-1: 4.2	18	Skrúfur	EN 1176-1: 4.2.5
4	Bönd	EN 1176-1: 4.2.12	19	Sæti	EN 1176-2: 4.4
5	Dekk	EN 1176-2: 4.4	20	Tappar	EN 1176-1: 4.2.5/4.1.4
6	Fallhæð	EN 1176-1: 4.2.8.1.4	21	Undirlag	EN 1177
7	Fallrými	EN 1176-1: 4.2.8.1.3	22	Útstæður hlutur	EN 1176-1: 4.2.5
8	Festingar	EN 1176-1: 4.2.5	23	Vantar	
9	Fjarlægðir	EN 1176-1: 4.2.7	24	Hreinlæti	EN 1176-7
10	Hentar ekki	Uppfyllir ekki lágmarkskröfur 1176	25	Viðhald	EN 1176-7
11	Hlutur laus	EN 1176-1: 4.2.14	26	Merkingar	EN 1176-1: 7
12	Keðjur	EN 1176-1: 4.2.13	27	Vantar upplýsingar um rekstraraðila	EN 1176-1: 6
13	Lega	EN 1176-5 og 6	28	Ekki vítað	EN 1176-1: 7
14	Mál	EN 1176-1: 4.2.7	29	Klemmihætta	EN 1176-1: 4.2.7
15	Samskeyti	EN 1176-1: 4.2.10	30	Aðgengi	EN 1176-1: 4.2.3
			31	Mála <u>galvaniserað</u> járn	EN 1176
Vettvangur og aðkoma			Aðstoðarbúnaður		
V1	Aðkoma/sjúkrabíll		A1	Hindranir	
V2	Göngustígur		A2	Girðingar	
V3	Plöntur		A3	Hlið	
V4	Rekstrarhandbók		A4	Skilti	
V5	Hreinlæti		A5	Ruslailát	
V6	Niðurfall		A6	Lýsing/ljósastaur	
V7	Veggjakrot		A7	Grasflötur	
V8	Annað		A8	Aðrir þættir	
Öll leiktæki eiga að vera merkt framleiðanda og/eða innflytjenda skv. 1176-1:7.					
Fleiri frávik geta verið til staðar en koma fram í þessari skýrslu sem gætu hafa farið <u>framhjá</u> skoðunarmanni á vettvangi.					

Vettvangur og aðkoma svæðis

V1 Aðkoma/sjúkrabíll	Í lagi
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald
V2 Göngustígar	Frávik

Leik011

Myndir af frávikum	 25 járn stendur út í gangveg	
Áhættumat - V2 Göngustígar	Miðlungs	
Miðlungsáhætta	Nokkur hættu á slysi/tjóni. Krefst lagfæringar innan 6 mánaða.	
V3 Plöntur	Í lagi	
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald	
V4 Rekstrarhandbók	Frávik	
Rekstrarhandbók vantar / Ekki hægt að sannreyna	Rekstrarhandbók á að vera til fyrir leiksvæði/skóla/leikskóla fyrir þau svæði þar sem leiktæki eru í notkun. Við skoðun okkar reyndist ekki mögulegt að sannreyna að slík handbók væri til staðar.	
Áhættumat - V4 Rekstrarhandbók	Lág	
Lágmarksáhætta	Lítill hættu á slysi/tjóni en þarfnast lagfæringar/viðhalds innan 12 mánaða	
V5 Hreinlæti	Frávik	

Leik011

Myndir af frávikum		
	24 víða grjót á leiksvæði	
Áhættumat - V5 Hreinlæti	Miðlungs	
Miðlungsáhætta	Nokkur hættu á slysi/tjóni. Krefst lagfæringar innan 6 mánaða.	
V6 Niðurföll	Í lagi	
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald	
V7 Veggjakrot	Í lagi	
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald	
V8 Annað	Í lagi	
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald	

Aðstoðarbúnaður

A1 Hindranir	Í lagi	
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald	
A2 Girðingar	Á ekki við	
A3 Hlið	Á ekki við	
A4 Skilti	Á ekki við	
A5 Ruslaflát	Í lagi	

Leik011

Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald	
A6 Lýsing/ljósastaurar	Frávik	
Mynd af frávikum		
	25 viðhald á staur	
Áhættumat - A6 Lýsing/ljósastaurar	Lág	
Lágmarksáhætta	Lítill hættu á slysi/tjóni en þarfnast lagfæringar/viðhalds innan 12 mánaða	
A7 Grasflötur	Í lagi	
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald	
A8 Aðrir þættir	Í lagi	
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald	

Nýtt tæki

Leik011

Mynd af tæki



Tegund tækis	18 Kastali
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já
Tegund frávika	8 Festingar, 17 Skemmdir, 21 Undirlag
Tegund frávika	22 Útstæður hlutur

Leik011

Myndir af frávikum



8 festingar vantar



8 festingar brotnar



22 naglar standa útúr við



21 dempandi undirlag vantar

Leik011

	 júl. 15, 2025 1:25:40 e.h. GMT+00:00	 júl. 15, 2025 1:25:46 e.h. GMT+00:00
	6/21 fallhæð yfir 1m - vantar dempandi undirlag	8 festingar brotnar
Áhættumat tækis	Talsverð	
Talsverð áhætta	Talsverð hættu á slysi/tjóni. Verður að lagfæra innan 3 mánaða.	

Nýtt tæki (1)

Leik011

Mynd af tæki



Tegund tækis	26 Róla
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já
Tegund frávika	21 Undirlag

Leik011

Myndir af frávikum	 21 dempanði undirlag vantar	
Áhættumat tækis	Talsverð	
Talsverð áhætta	Talsverð hættu á slysi/tjóni. Verður að lagfæra innan 3 mánaða.	

Nýtt tæki (2)

Leik011

Mynd af tæki



Tegund tækis	24 Rá
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Krumma
Frávik	Nei
Í lagi	Reglubundin skoðun og viðhald

Nýtt tæki (3)

Leik011

Mynd af tæki



Tegund tækis	7 Borð
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já
Tegund frávika	11 Hluttur laus
Áhættumat tækis	Lág
Lágmarksáhætta	Lítill hættu á slysi/tjóni en þarfnast lagfæringar/viðhalds innan 12 mánaða

Nýtt tæki (4)

Leik011

Mynd af tæki



Tegund tækis	16 Jafnvægisslá
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já
Tegund frávika	17 Skemmdir

Leik011

Myndir af frávikum	 17 skemmdir á við
Áhættumat tækis	Miðlungs
Miðlungsráttur	Nokkur hættu á slysi/tjóni. Krefst lagfæringar innan 6 mánaða.

Nýtt tæki (5)

Leik011

Mynd af tæki



Tegund tækis	19 Klifurtæki
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já
Tegund frávika	6 Fallhæð, 21 Undirlag

Leik011

Myndir af frávikum	 júl. 15. 2025 1:34:59 e.h. GMT+00:00 6/21 fallhæð 192cm - vantar dempandi undirlag
Áhættumat tækis	Talsverð
Talsverð áhætta	Talsverð hættu á slysi/tjóni. Verður að lagfæra innan 3 mánaða.

Nýtt tæki (6)

Leik011

Mynd af tæki



Tegund tækis	7 Borð
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já
Tegund frávika	11 Hluttur laus
Áhættumat tækis	Lág
Lágmarksáhætta	Lítill hættu á slysi/tjóni en þarfnast lagfæringar/viðhalds innan 12 mánaða

Nýtt tæki (7)

Leik011

Mynd af tæki



Tegund tækis	11 Göng
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já


Leik011

Myndir af frávikum	 6/21 fallhæð 105cm - vantar dempandi undirlag
Áhættumat tækis	Talsverð
Talsverð áhætta	Talsverð hættu á slysi/tjóni. Verður að lagfæra innan 3 mánaða.

Nýtt tæki (8)

Leik011

Mynd af tæki

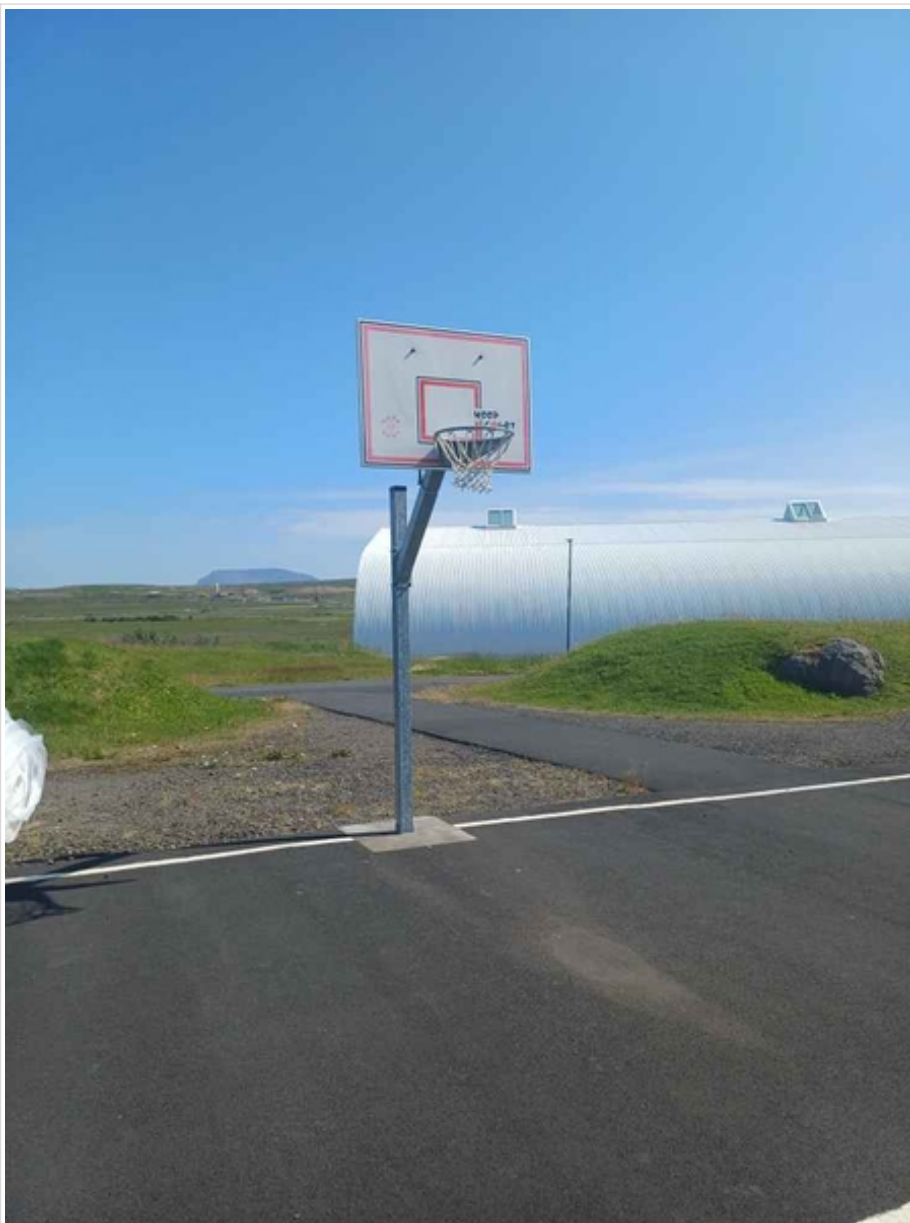

Tegund tækis	17 Karfa
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Sure Shot
Frávik	Já
Tegund frávika	31 Mála galvaníserað járn

Leik011

Myndir af frávikum	 31 mála þarf galvaniserað járn upp í 1.5m
Áhættumat tækis	Lág
Lágmarksáhætta	Lítill hættu á slysi/tjóni en þarf nast lagfæringar/viðhalds innan 12 mánaða

Nýtt tæki (9)

Leik011

Mynd af tæki



Tegund tækis	17 Karfa
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Sure Shot
Frávik	Já
Tegund frávika	31 Mála galvaníserað járn

Leik011

Myndir af frávikum	 31 mála þarf galvaniserað járn upp í 1.5m
Áhættumat tækis	Lág
Lágmarksáhætta	Lítill hættu á slysi/tjóni en þarfnast lagfæringar/viðhalds innan 12 mánaða

Nýtt tæki (10)

Leik011

Mynd af tæki	
Tegund tækis	30 Sparkvöllur
Framleiðandi/Dreifingaraðili	Tæki ómerkt
Frávik	Já
Tegund frávika	16 Festihætta, 6 Fallhæð, 25 Viðhald, 21 Undirlag
Tegund frávika	30 Aðgengi

Leik011

Myndir af frávikum	 júl. 15, 2025 1:42:06 e.h. GMT+00:00 25 viðhald	 júl. 15, 2025 1:42:10 e.h. GMT+00:00 16 festihætta (fingertrap)
	 júl. 15, 2025 1:42:23 e.h. GMT+00:00 6/30 fallhæð 300cm - aðgengi óheft- 21 vantar dempandi undirlag	 júl. 15, 2025 1:42:46 e.h. GMT+00:00 25 viðhald á neti
Áhættumat tækis	Talsverð	
Talsverð áhætta	Talsverð hættu á slysi/tjóni. Verður að lagfæra innan 3 mánaða.	

Skilgreining áhættu

Leik011

Skilgreiningar á áhættu	I = Í lagi Reglubundin skoðun og viðhald	L=Lágmarksáætla Lagfæra fyrir næstu skoðun	M=Miðlungsáætla Lagfæra innan 6 mánaða
	T = Talsverð áætla Lagfæra innan 3 mánaða	H = Hámarksáætla Lagfæra eða fjarlægja tæki strax	

Undirskrift

Undirskrift skoðunaraðila	
Skýrslu lokið	15.07.2025
