

Vinnufundur 05

| | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Verknúmer 12026 | Verkkaupi Langanesbyggð |
| Dagsetning / tími 26.03.2026 / 14:00 | Verkþáttur Endurgerð A og B rif – Rif og uppbygging C |
| Unnið af Almar E. | Staðsetning / Lýsing Langanesvegur 20 680 Þórshöfn |
| Verkkaupi / Tengiliður Björn S. Lárusson | Dreifing: Vinnuhópur |

Boðaðir til rýnifundar: (mættir eru **bláir**)

| | | |
|--------------------------------|------|--------------------------------|
| Almar Eggertsson | (AE) | Faglausn |
| Hermann Herbertsson | (HH) | Faglausn |
| Arnar Ólafsson | (AO) | Teiknistofa norðurlands (TSNL) |
| Björn L. Sigurðsson | (BS) | Langanesbyggð (Sveitastjóri) |
| Þorri Friðriksson | (ÞF) | Langanesbyggð (Áhaldahús) |
| Sigurður Þór Guðmundsson | (SG) | Langanesbyggð (Oddvitii) |
| Hilma Steinarsdóttir | (HS) | Langanesbyggð (Skólastjóri) |
| Steinunn Guðnadóttir | (SG) | Langanesbyggð (Grunnskóli) |
| Júlíus Sigurbjartsson | (JS) | Langanesbyggð (Sveitastjórn) |
| Sigríður Friðný Halldórsdóttir | (SH) | Langanesbyggð (Sveitastjórn) |
| Arnór Ísak Haddsson | (AH) | Faglausn |

Fráverandi: Arnar Ólafsson, Júlíus Sigurbjartsson

Afboðaðir: Sigurður Þór Guðmundsson

Fylgiskjöl: Tillöguteikningar, ein hæð til suðurs – Innra skipulag og útlit

05.01 Fundargerð.

Fundargerðin skilst sem skriflegt samkomulag milli þeirra sem viðkemur málið. Hafi ekki komið athugasemd seinast, fyrir næsta fund á eftir er fundargerð þessi samþykkt.

Rautt letur er nýtt


Svart letur er frá eldri fundargerðum

05.02 Athugasemdir vegna síðustu fundargerðar.

Engar ath.


05.03 Teikningar

Lagðar fram til kynningar, útlit og innra skipulag

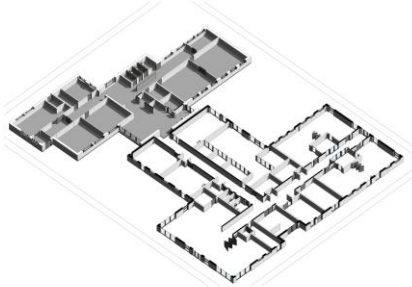

Vinnufundur 05

05.04 Innra skipulag

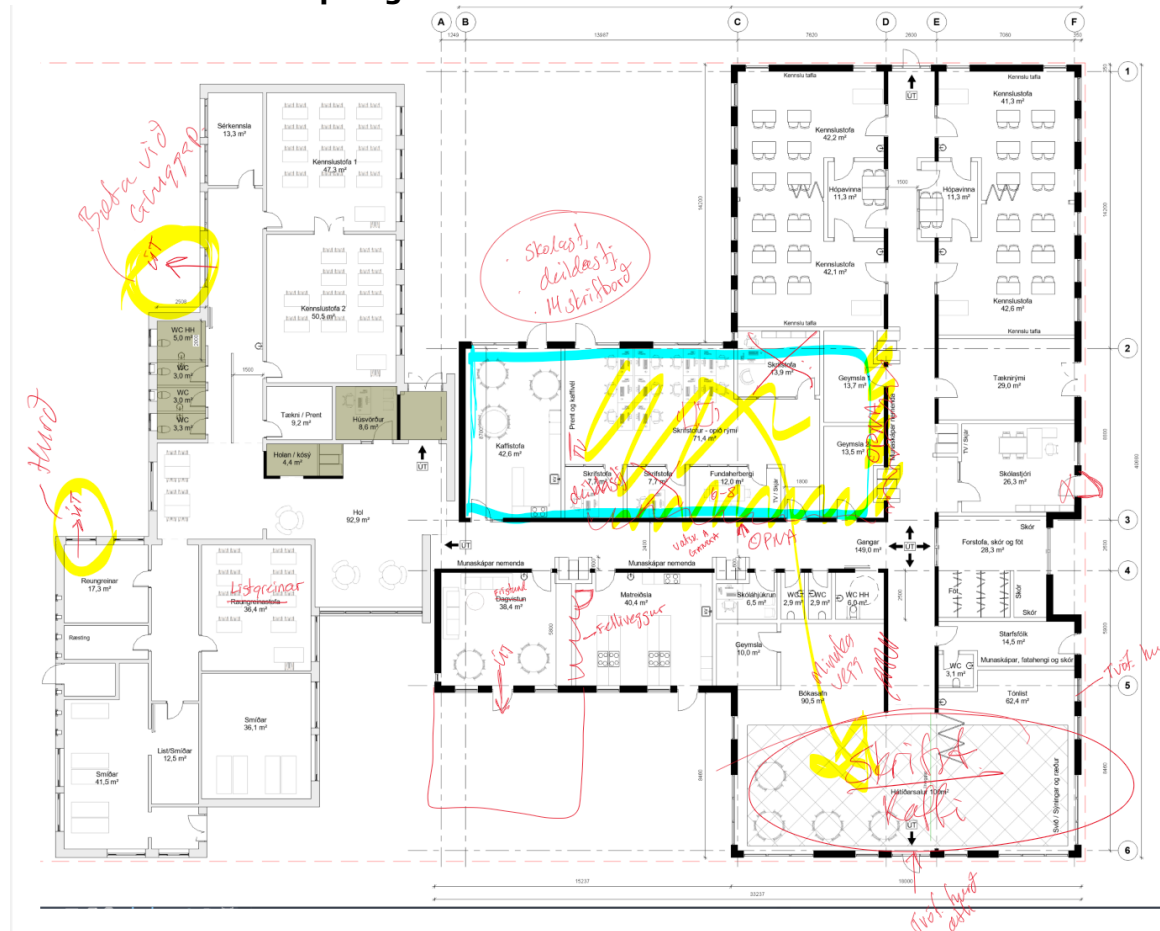

| Nýbygging | Núverandi A og B |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fellivegg á milli Matreiðslu og Frístund | Setja hurð út til norðurs af gangi í B hluta |
| Tvöfalda hurð beint út úr tónlist | Setja hurð út frá Raungreinastofu |
| Færa starfsmannarými, kaffistofu og geymslu yfir í austur enda. Setja bókasafna og tónlist þar sem starfsmannarými var. Opna alveg fram á gang, þannig að gengið verði inn í opið rými frá nýjum inngang að sunnan. | Möguleikar í holi og anddyri. <ul style="list-style-type: none"> Minnka anddyri og hafa sem gang / flottaleið út. Skrifstofa Húsvörður eða hjúkrun ? Hol básar |
| Lokaðar skrifstofur þurfa að vera tvær <ul style="list-style-type: none"> Skólastjóri Deildarstjóri | |
| 14 vinnustöðvar fyrir kennara | |
| | Bæta hljóðvist í núverandi kennslustofum - Glymjandi inn í stofum. |
| Kyndikerfi þarf að gera ráð fyrir fjarvarma | |

Annað:

Byggingarsvæði á skólatíma og öryggissvæði þar í kring.
-Akveðið að reyna að nota núverandi inngang allan byggingartímann

Vinnufundur 05

05.05 Útlit

1. AE mælir með forsteyptum samlokueiningum. En nefnir einnig timbur vegg.
a. Kostur við forsteypt er fyrst og fremst stuttur byggingartími

05.06 Framkvæmdir Almennt.

1. Rafmagn AE tali við Víkurraf um mögulega aðkomu þeirra þega þarf.
2. Lagnir Vikar hefur verið í samtali við Norðurlagnir
3. Vikar metur það sem á að geyma og það sem á henda
4. Taka niður allan veggfastan búnað í C
5. Ekki að taka niður úr loftum annað en kerfisloft
6. Geyma loftræsilagnir, mögulega hægt að nota við nýbyggingu.
7. Breyta snyrtingum í B þannig að beint aðgengi verði frá gangi og inn á wc. Það er hægt að koma fyrir þremur venjulegum wc og einni HH-wc.
 - a. Brjóta upp gólf, leggja nýja fráveitu (út úr vegg)
 - b. Nýtt neysluvatn
 - c. Einangra og steypa nýtt gólf
 - d. Skoða hvort það þarf skilrúm á gangi til að ekki verði beint aðgengi inn á gang.

Verktakar

1. Gera verksamninga / yfirlýsingu við verktaka, festa tímagjald, og ferðakostnað ?
2. RAF – Færa smáspennuskláp af lofti. Best að koma hönum fyrir í anddyri
3. Skipta um alla lampa í A, B og anddyri. Setja Led í staðinn sem passa í núverandi festingar / upphengjur.
4. Securitas þarf að koma og breyta öryggiskerfi MHL 03 og 04 (Rás 1)
5. Aftengja rafmagn / lokar o.fl. við loftræsilagnir í C
6. RAF – Ljósleiðari
7. Sökkjar og jarðvegslagnir norður og austur
 - a. Vikar tali við BJ
 - b. AE taki saman helstu magntölur og fái verð frá BJ
8. Lægra þak yfir B
 - a. AE ramma inn hvað þarf að gera og geri / Aðlagi nauðsynlegar teikningar.
 - b. Ramma inna og taka saman helstu magntölur
 - c. Fá verð hjá verktaka

Vinnufundur 05

03.02 Önnur mál.
1. Engin önnur mál

Fundi lokið kl. 15:30

Næsti fundur.

Ákveðið síðar stefnt á fyrir páska (AE) sendir fundarboð

Dreifing.



Almar Eggertsson
Owner



arnar@tsnl.is
Guest



Björn Sigurður Lárusson
Guest



Hermann Herbertsson
Member



hilma.steinarsdottir@thorshafnarskoli.is
Guest



juliussigurbjartsson@simnet.is
Guest



sigurdur.thor.gudmundsson@langanesbyggd.is
Guest



steinunn@thorshafnarskoli.is
Guest



thorri.fridriksson@langanesbyggd.is
Guest
